



**X Коллегия  
Контрольно-счетной Палаты г. Якутска**

**Неустроев Герман Робертович**

Аудитор Контрольно-счетной палаты г. Якутска

**Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт образовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» за 2021-2022 годы, текущий период 2023 года»**

**05 июня 2024 года**



# Основные сведения о контрольном мероприятии

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.18 Плана работы КСП г. Якутска
2. Предмет контрольного мероприятия: процесс предоставления и использования средств, направленных на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации муниципальных программ «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» и «Развитие образования городского округа «город Якутск».
3. Объекты контрольного мероприятия:
  - 3.1. Управление образования ОА г. Якутска
  - 3.2. Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры ОА г. Якутска
  - 3.3. МКУ «Главстрой» ГО «город Якутск»
  - 3.4. муниципальные образовательные учреждения, в которых производился ремонт (11 объектов)
4. Сроки проведения контрольного мероприятия:
  - 4.1. Подготовительный этап: с 21.09.2023 по 29.09.2023.
  - 4.2. Основной этап: с 02.10.2023 по 01.12.2023.
  - 4.3. Заключительный этап: с 11.12.2023 по 12.12.2023.


# Краткая характеристика проверяемой сферы

- на 2021-2022 учебный год из 65 объектов общеобразовательных учреждений требует капитального ремонта 49 объектов или 75,4%;

- на 2022-2023 учебный год из 63 объектов общеобразовательных учреждений требует капитального ремонта 40 объектов или 63,5%.

Согласно информации Управления образования полный износ недвижимого имущества зафиксирован у 45,8% образовательных учреждений, из них: 53,7% по дошкольным образовательным учреждениям, 37% по общеобразовательным учреждениям, 86,1% по учреждениям дополнительного образования.


## Степень износа образовательных учреждений ГО "город Якутск"

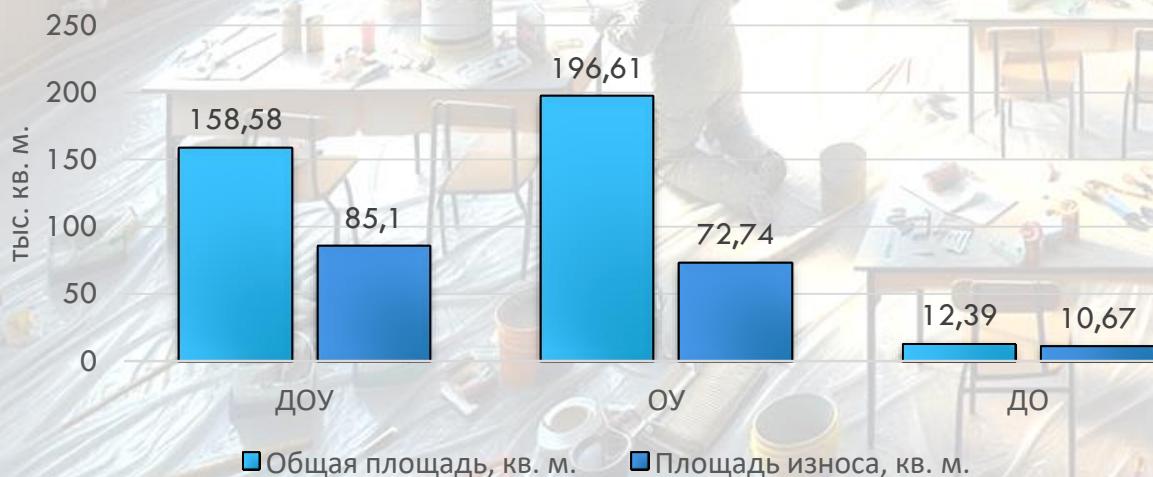



В проверяемый период на реализацию мероприятий по капитальному ремонту образовательных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие образования городского округа «город Якутск» в соответствии с решениями о бюджете ГО «город Якутск», сводной бюджетной росписи плановые бюджетные назначения на проведение капитального ремонта образовательных учреждений предусмотрено **2 362 247,2 тыс. рублей**, кассовое исполнение составило **2 211 320,9 тыс. рублей**, в том числе:

### Кассовое исполнение мероприятий по капремонту ОУ

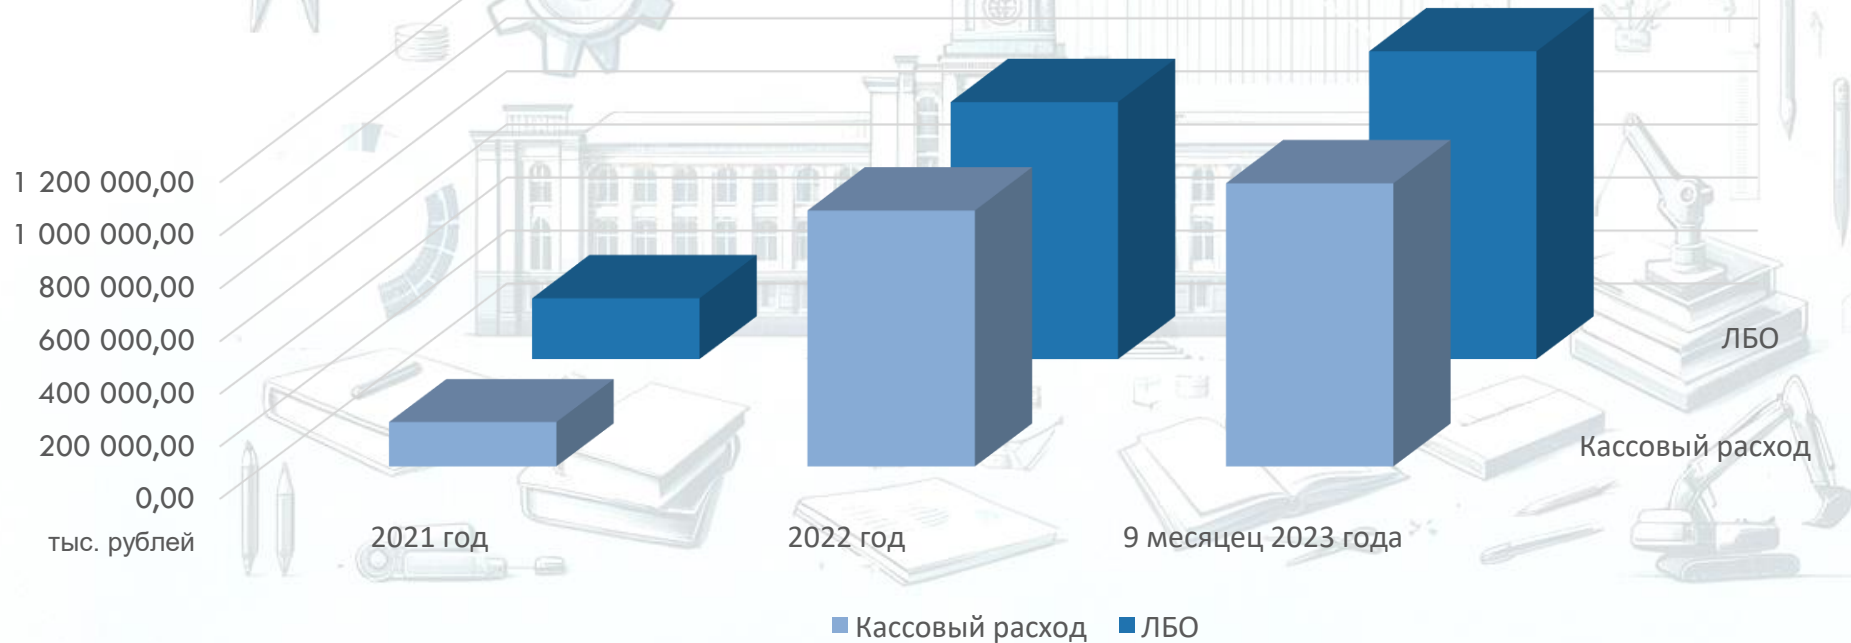



## Соглашения, заключенные между Министерством образования и науки РС(Я) и Окружной администрацией города Якутска на реализацию мероприятий по капремонту образовательных учреждений в 2022 году

В соответствии с условиями соглашения от 25.02.2022 №98701000-1-2022-026 на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования путем проведения капитального ремонта 11 учреждений направлено 772 308,9 тыс. рублей, из них: 687 355,3 тыс. рублей или 89% за счет субсидии из государственного бюджета РС(Я), 84 953,6 тыс. рублей или 11% за счет средств местного бюджета ГО «город Якутск»

	Наименование организации	Всего средств на проведение капитального ремонта		
		Итого	ФБ	МБ
1	МАОУ "Саха-политехнический лицей	117 664 354,69	104 721 275,65	12 943 079,04
2	МОБУ "СОШ №10 им. Д.Г. Новошапина"	110 807 132,29	98 618 347,71	12 188 784,58
3	МОБУ "СОШ №20 им. Героя Советского Союза Ф.К. Попова"	14 876 000,00	13 239 640,00	1 636 360,00
4	МОБУ "СОШ №21"	97 148 536,67	86 462 197,55	10 686 339,12
5	МАОУ "СОШ №23 им. В.И. Малышкина"	79 631 226,34	70 871 791,44	8 759 434,90
6	МОБУ "СОШ №27"	28 683 247,87	25 528 090,60	3 155 157,27
7	МОБУ "СОШ №31"	91 427 359,32	81 370 349,79	10 057 009,53
8	МОБУ "СОШ №33 им. Л.А. Колосовой"	49 000 000,00	43 610 000,00	5 390 000,00
9	МОБУ "СОШ №36 "Надежда"	4 970 000,00	4 423 300,00	546 700,00
10	МОБУ "ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых"	96 106 914,78	85 535 154,09	10 571 760,69
11	МОБУ "Мархинская СОШ №1"	81 994 157,00	72 974 799,72	9 019 357,28
	<b>ИТОГО</b>	<b>772 308 928,96</b>	<b>687 354 946,56</b>	<b>84 953 982,40</b>



## Соглашения, заключенные между Министерством образования и науки РС(Я) и Окружной администрацией города Якутска на реализацию мероприятий по капремонту образовательных учреждений в 2023 году

В соответствии с условиями соглашений на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования путем проведения капитального ремонта 13 учреждений направлено 1 084 411,6 тыс. рублей, из них: 943 690,0 тыс. рублей или 87% за счет субсидии из государственного бюджета РС(Я), 140 721,6 тыс. рублей или 13 % за счет средств местного бюджета ГО «город Якутск»

	Наименование организации	Всего средств на проведение капитального ремонта		
		Итого	ФБ	МБ
1	МОБУ "Маганская СОШ"	87 372 186,56	77 761 246,04	9 610 940,52
2	МОБУ "Саха гимназия"	139 666 629,21	124 303 300,00	15 363 329,21
3	МОБУ "СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина"	94 104 593,24	83 753 087,98	10 351 505,26
4	МОБУ "СОШ №12"	44 976 540,31	40 029 120,88	4 947 419,43
5	МОБУ "СОШ №13"	142 684 157,30	126 988 900,00	15 695 257,30
6	МОБУ "СОШ №19"	88 121 240,67	78 427 904,20	9 693 336,47
7	МОБУ "СОШ №24 им. С.И. Климакова"	37 104 102,78	33 022 651,47	4 081 451,31
8	МОБУ "СОШ №26"	74 089 109,64	65 939 307,58	8 149 802,06
9	МОБУ "СОШ №29"	142 684 157,30	126 988 900,00	15 695 257,30
10	МОБУ "Табагинская СОШ"	86 636 687,04	77 106 651,47	9 530 035,57
11	МОБУ "Хатасская СОШ"	82 227 769,32	73 182 714,69	9 045 054,63
12	МОБУ "СОШ №38"	50 457 865,18	44 907 500,01	5 550 365,17
13	МОБУ "СОШ №7"	142 684 157,30	126 988 900,00	15 695 257,30
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 212 809 195,85</b>	<b>952 411 284,31</b>	<b>112 163 389,07</b>



## Общая сумма нецелевого использования бюджетных средств, выраженная в принятии и оплате фактически невыполненных работ составила 16 392,7 тыс. рублей.

1. По Управлению образования ОА г. Якутска –  
1 474,18 тыс. рублей

2. По МКУ «Главстрой» ГО «город Якутск –  
14 918,53 тыс. рублей

№ п/п	Осмотренные объекты капитального ремонта	Сумма контракта	Оплата	Сумма нецелевого использования б/с	% нецелевого использования
1	МБДОУ "Д/с №14"	1 835,14	1 835,14	196,82	10,7
2	МБДОУ "ЦРР - Д/с №3"	605,62	605,62	30,68	5,1
3	МБОУ ДО "Д(п)Ц"	800,39	800,39	6,59	0,8
4	МОБУ "СОШ №21"	11 640,30	11 640,30	671,28	5,8
5	МАОУ "СОШ №23"	1 031,09	1 031,09	21,30	2,1
6	МОБУ "СОШ №31"	1 943,32	1 943,32	547,52	28,2
	<b>Итого</b>	<b>17 855,86</b>	<b>17 855,86</b>	<b>1 474,18</b>	<b>8,3</b>

№ п/п	Осмотренные объекты капитального ремонта	Сумма контракта	Оплата	Сумма нецелевого использования б/с	% нецелевого использования
1	МОБУ «СОШ №21»	97 148,54	97 148,54	8 518,16	8,8
2	МАОУ «СОШ №23»	79 631,20	79 631,20	163,13	0,2
3	МОБУ «СОШ №29»	123 556,50	123 293,40	5 478,15	4,4
4	МОБУ «СОШ №7»	132 798,80	132 798,80	759,08	0,6
	<b>Итого</b>	<b>433 135,04</b>	<b>432 871,94</b>	<b>14 918,53</b>	<b>3,4</b>




3. Также установлен факт нецелевого использования бюджетных средств ГО «город Якутск», выраженный в оплате расходов на проведение капитального ремонта здания Управления образования по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 79, за счет средств, предназначенных для капитального ремонта образовательных учреждений на сумму 7 867,3 тыс. рублей.





Управлением образования ОА г. Якутска допущено нецелевое использование бюджетных средств, предусмотренных на капремонт образовательных учреждений, выразившееся в проведении ремонтных работ в здании самого Управления на общую сумму 7 867,3 тыс. рублей.







# Нецелевое использование бюджетных средств допущенное МКУ

## «Главстрой» ГО «город Якутск»

в ходе исполнения МК №КР-14/2022 на объекте:

**МОБУ «СОШ № 21» ГО «город Якутск»**

**Подрядчик: ООО «Оптима-Строй»**

1. Установлено отсутствие выполненных работ по «Устройству потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля» в объеме 538,5 кв. м. на сумму 1 251,4 тыс. рублей



3. Установлено отсутствие «Блоков дверных внутренних: однопольных шлифованных, из массива сосны, тонированных» в объеме 87,12 кв. м. на сумму 1 019,2 тыс. рублей

2. Установлено отсутствие «Блоков оконных пластиковых: двустворчатых, с глухой и поворотно-откидной створкой, площадью более 3,5 м<sup>2</sup>» в объеме 190,53 кв. м. на сумму 3 860,2 тыс. рублей



4. Общая сумма принятых, но невыполненных работ составила 8 518,2 тыс. рублей или 8,77% от суммы контракта.



## Нецелевое использование бюджетных средств допущенное МКУ

«Главстрой» ГО «город Якутск»

в ходе исполнения МК №КР-17/2022 на объекте:

МАОУ «СОШ № 23 им. В.И. Малышкина» ГО «город Якутск»

**Подрядчик: ООО «Вертикаль»**

1. Установлено отсутствие выполненных работ по «Установке блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м<sup>2</sup> в объеме 13,23 кв. м. на сумму 29,8 тыс. рублей

2. Установлено отсутствие «Дверей стальных утепленных двупольных 2ДСУ 2.02.4» в кол-ве 4 шт. на сумму 133,3 тыс. рублей



*На представленных фото, изображены двери, установленные ООО «Вертикаль» в ходе устранения нарушений, выявленных в рамках контрольного мероприятия.*



**Нецелевое использование бюджетных средств допущенное МКУ  
«Главстрой» ГО «город Якутск»  
в ходе исполнения МК №КР-04/2023 на объекте:  
МОБУ «СОШ № 7» ГО «город Якутск»  
Подрядчик: ПК «Монтажник»**

1. Установлено отсутствие «Блоков оконных из ПВХ-профилей, глухих, одностворчатых с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м<sup>2</sup>» в объеме 22,8 кв. м. на сумму 340,8 тыс. рублей и выполнения работ по их установке на сумму 65,6 тыс. рублей



2. Установлено отсутствие 4 душевых поддонов (с установкой) и 8 писсуаров (с установкой) на общую сумму 91,4 тыс. рублей



*На представленных фото, изображены окна и писсуары, установленные ПК «Монтажник» в ходе устранения нарушений, выявленных в рамках контрольного мероприятия.*



## Нецелевое использование бюджетных средств допущенное МКУ

«Главстрой» ГО «город Якутск»

в ходе исполнения МК №КР-14/2023 на объекте:

МОБУ «СОШ № 29» ГО «город Якутск»

**Подрядчик: ООО «Оптима-Строй»**

1. Установлено отсутствие выполненных работ по «Устройству потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля» в объеме 1 755,1 кв. м. на сумму 4 200,92 тыс. рублей.



2. Установлено отсутствие выполненных работ по «Устройству потолков Грильятто: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля» в объеме 137,2 кв. м. на сумму 116,73 тыс. рублей.





## Нецелевое использование бюджетных средств допущенное МКУ

«Главстрой» ГО «город Якутск»

в ходе исполнения МК №КР-14/2023 на объекте:

МОБУ «СОШ № 29» ГО «город Якутск»

**Подрядчик: ООО «Оптима-Строй»**

3. Установлено отсутствие принятых актами о приемке и оплаченных Тепловых завес Olefini K-44 и АРЕН-13 на сумму **171,01 тыс. рублей**, вместо них установлены более дешевые аналоги «Тепломаш» и «Tropikline»



4. Установлено отсутствие принятых, актами о приемке и оплаченных видеокамер Beward B1210DM в кол-ве 56 шт. и Beward B2710RZK в кол-ве 14 шт. на общую сумму **867,35 тыс. рублей**, вместо них установлены более дешевые аналоги «HiWatch»



5. Общая сумма принятых, но невыполненных работ составила **5 478,2 тыс. рублей**.

**Некачественное выполнение капитального ремонта  
в ходе исполнения МК №КР-14/2023 на объекте:  
МОБУ «СОШ № 29» ГО «город Якутск»  
Подрядчик: ООО «Оптима-Строй»**



1. Дверные наличники в некоторых кабинет и хоз. помещениях отходят от стен

2. На 3 этаже, в туалете, частично разрушены керамические плиты. По всей площади туалетов видны следы некачественной затирки межкафельных швов.

4. В каб. 37 отходит оконный откос.

5. В холлах 2-го и 3-го этажа стены имеют следы непрокрасов.

# Некачественные работы, принятые МКУ «Главстрой» ГО «город Якутск»

в ходе исполнения МК №КР-07/2023 на объекте:  
**МОБУ «СОШ № 26» ГО «город Якутск»**  
*Подрядчик: ООО «Кинг-95»*



1. Установлено, что защитная пленка снаружи окон не удалена
3. В кабинете № 213 (кабинет начальных классов) на 2 этаже после проведения капитального ремонта перестала функционировать система водоотведения



2. В кабинетах №№ 106, 107 на 1 этаже имелись случаи протечки со сливных кранов, прикрученных в трубы системы отопления
4. В спортзале № 1 на 1 этаже продувает из 3 окна.





# Нецелевое использование бюджетных средств допущенное Управлением образования ОА г. Якутска в ходе исполнения МК №297/23 на объекте: МБОУ ДО «Д(п)Ц» ГО «город Якутск» Подрядчик: ООО «СПК-Техстрой»

Установлено отсутствие «Крана стального шарового фланцевого диаметром: 25 мм» (п. 8.1 акта о приемке) в количестве 1 шт. на сумму 1,1 тыс. рублей и работ его установки на сумму 5,4 тыс. рублей



Согласно пояснению Управления от 14.11.2023 №сз2144/УО при прохождении согласования проекта ЯТЭЦ внесли изменения в узел ввода, в результате подрядчик был вынужден установить дополнительный грязевик на обратке, а один кран шаровый удален из проекта.

При этом, соответствующие изменения в объемы работ не вносились в муниципальный контракт от 14.06.2023 № 297/23 в соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ). Факт установки «грязевика на обратке» документально не подтверждается, Управлением данные работы не принимались.




# Нецелевое использование бюджетных средств допущенное Управлением образования ОА г. Якутска в ходе исполнения МК №341/23 на объекте: МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 3» ГО «город Якутск» Подрядчик: ООО «Страйк»



1. Установлено отсутствие «Блока дверного одностворчатого, глухого, размером 800х2000 мм», комплекта скобяных изделий и работ по установке двери на общую сумму 14,6 тыс. рублей.



2. Установлено отсутствие «Плитки керамической глазурованной для облицовки стен: многоцветной» в объеме 19,45 кв. м. на сумму 13,7 тыс. рублей.

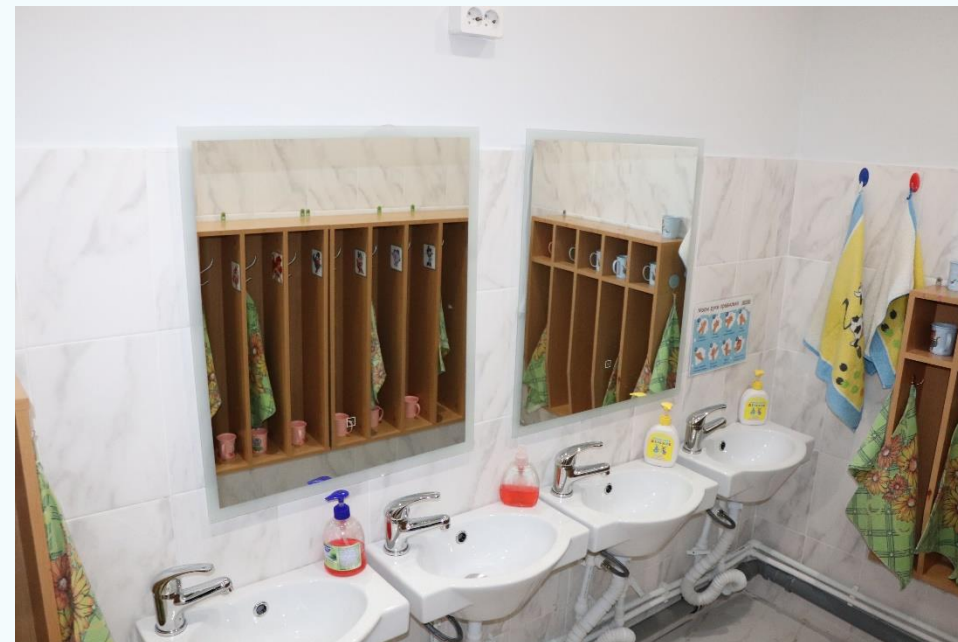

Нецелевое использование бюджетных средств допущенное  
Управлением образования ОА г. Якутска  
в ходе исполнения МК №341/23 на объекте:  
МБДОУ «Детский сад № 14 «Журавлик» ГО «город Якутск»  
*Подрядчик: ИП Казарян Левон Григорьевич*



1. Установлено отсутствие принятых актами о приемке и оплаченных Управлением насосов циркуляционных WiloStar RSD 30/4, Grundfos UPS 4060/4, Grundfos UPS 4060/2, Wilo TOPS 65/7 на общую сумму 196,8 тыс. рублей.

2. Кроме того, установлено неиспользование 3 унитазов «Комфорт» и 4 раковин, которые на момент осмотра находились на балконе на 3 этаже проверяемого объекта, на общую сумму 32,4 тыс. рублей.



# Нецелевое использование бюджетных средств допущенное Управлением образования ОА г. Якутска в ходе исполнения МК №235/69601 на объекте: МОБУ «СОШ № 21» ГО «город Якутск» Подрядчик: ООО «Оптима-Строй»

Управлением приняты актами о приемке и оплачены фактически невыполненные работы на общую сумму 228 тыс. рублей.




№ п/п по акту	Наименование работ	Ед. изм.	По акту/ смете, ед.	Фактическое значение, ед.	Отклонение, ед.	Принятая и оплаченная сумма	Сумма отклонения	Сумма отклонения с учетом поправ. коэфф и НДС
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=(7/4)*6	9=8*0,818*1,2
8	Установка ручных насосов	узел	1	0	1	9,0	9,0	8,8
9	Насос ручной поршневой, производительность до 22 л/мин	шт	1	0	1	7,5	7,5	7,4
19	Устройство отборное давления ЗК14	шт	10	2	8	35,5	28,4	27,8
26	Лестница алюминиевая с площадкой, высота рабочей площадки 2,0м 2200х1000х600, грузоподъемность 120кг Л312А	шт	1	0	1	37,9	37,9	37,2
27	Установка калориферов массой: до 0,1 т	шт	2	1	1	14,4	7,2	7,1
28	Теплообменник пластинчатый "Кельвион" 105 кВт	шт	2	1	1	96,7	48,4	47,5
29	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт	1	0	1	19,5	19,5	19,1
30	Насос циркуляционный ГВС TOPZ 30/10 3RG RN 10	шт	1	0	1	74,5	74,5	73,1



# Нецелевое использование бюджетных средств допущенное Управлением образования ОА г. Якутска в ходе исполнения МК №237/69601 на объекте: МОБУ «СОШ № 21» ГО «город Якутск» Подрядчик: ООО «Дальний Восток»

Установлено отсутствие принятых актами о приемке и оплаченных Управлением следующих работ на общую сумму 443,3 тыс. рублей:

1. 62 секций радиаторов отопительных чугунных на сумму 59,5 тыс. рублей;
2. Работ по установке указателей уровня кранового типа в кол-ве 28 компл. на сумму 98,8 тыс. рублей;
3. Клапанов терморегулирующих в кол-ве 14 шт. на сумму 8,8 тыс. рублей;
4. Элементов термостатических Danfoss RTD3586 в кол-ве 14 шт. на сумму 14,4 тыс. рублей;
5. Клапанов Danfoss RLV20 угловых в кол-ве 240 шт. на сумму 255,7 тыс. рублей.

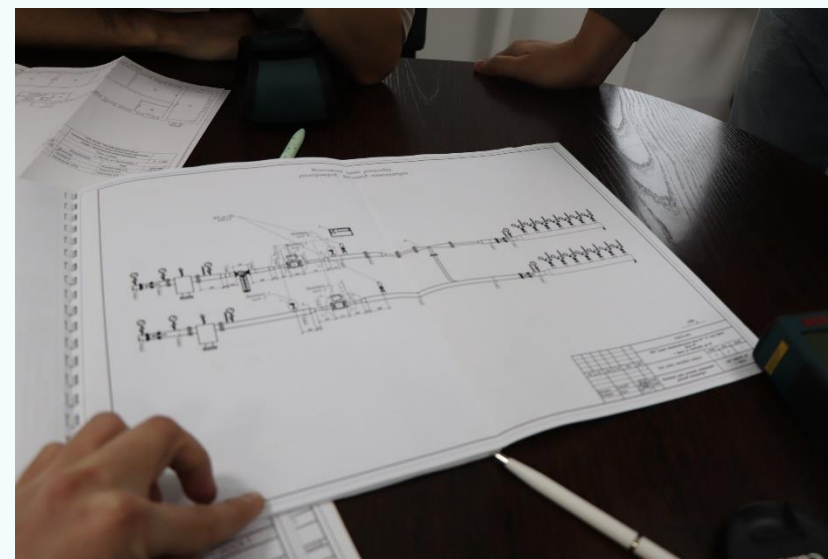

Нецелевое использование бюджетных средств допущенное  
Управлением образования ОА г. Якутска  
в ходе исполнения МК №1095184 на объекте:  
МАОУ «СОШ № 23 им. В.И. Малышкина» ГО «город Якутск»  
*Подрядчик: ООО «Вертикаль»*



1. Установлено отсутствие «Светильников аварийных светодиодных» и работ по их установке на общую сумму 21,30 тыс. рублей.





# Нецелевое использование бюджетных средств допущенное Управлением образования ОА г. Якутска в ходе исполнения МК №1782 на объекте: МАОУ «СОШ № 31» ГО «город Якутск» Подрядчик: ИП Иванов Георгий Романович

1. Установлено отсутствие принятых и оплаченных работ Управлением по «Установке светильников светодиодных (материал заказчика) в кол-ве 965 шт. или 50,79% от общего количества светильников на сумму 547,52 тыс. рублей.



г. Якутск

Управление образования Окружной администрации города Якутска, именуемому в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Петровой Марины Петровны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Иванова Георгия Романовича, действующего от своего и с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил следующие услуги в соответствии с контрактом № 178 26.07.2022г. на выполнение ремонтных работ в МОБУ СОШ №31.

2. Заказчик принял результаты работ:  
Выполнение ремонтных работ в МОБУ СОШ №31.

3. Качество выполненных работ соответствует требованиям контракта.

4. Общая стоимость выполненных работ составляет: 1 943 317 (один миллион девятьсот сорок тысяч триста семнадцать) рублей 00 копеек.

5. За выполненные работы сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заклаче контракта: \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек.  
Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: отсутствует.  
Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, \_\_\_\_\_)

Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по конт \_\_\_\_\_ рублей 00 копе \_\_\_\_\_

6. Заказчиком проведена экспертиза исполнения контракта за период с «26» июля 2022г. по августа 2022г. по результатам, которой установлено: работы выполнены в соответствии с контрактом.

Подписи членов экспертной комиссии, созданной приказом Управления образования Окружной администрации города Якутска №01-10/938 от «10» августа 2022г.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.

Сдал: ПОДРЯДЧИК \_\_\_\_\_  
М.П. ИВАНОВ Георгий Романович

Принял: ЗАКАЗЧИК \_\_\_\_\_  
М.П. \_\_\_\_\_

Обменявшись мнениями, Президиум оперативного штаба решил:

1. Согласовать заявку Управления образования Окружной администрации города Якутска об осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение ремонтных электромонтажных работ МОБУ СОШ № 31 в размере 1 943 317,00 руб. В соответствии с требованиями статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определен предполагаемый исполнитель индивидуальный предприниматель Иванов Георгий Романович (ИНН 142402034636, г. Якутск), предложивший по методу сопоставимых цен наименьшую стоимость по исполнению контракта и готовый выполнить работы в срок до 10 августа 2022 г.

2. При этом данный муниципальный контракт был заключен с ИП Ивановым Георгием Романовичем путем закупки у единственного поставщика на основании приказа УО ОА г. Якутска от 25.07.2022 №01-10/841



# Нецелевое использование бюджетных средств допущенное МОБУ

«СОШ №3» ГО «город Якутск»

в ходе исполнения контракта №ВР0999614

*Подрядчик: ИП Иванов Павел Юрьевич*

Установлено, что Учреждением приняты и оплачены фактические невыполненные работы по «Укладке искусственной травы на основе коврового покрытия /полипропилен/ с высотой ворса не менее 22мм» в объеме 168 кв. м. на сумму 119,7 тыс. рублей.

Данный факт, по словам директора Учреждения, обусловлен поздним доведением средств субсидии, предоставленной Управлением образования.

Искусственная трава находится на территории Учреждения.

Имеется гарантийное письмо от подрядчика об укладке травы в срок до 30 мая 2024 года.





# Нарушение ч. 1 ст. 95 № 44-ФЗ

Контрольным мероприятием, установлено, что МКУ «Главстрой» ГО «город Якутск» в 2023 году необоснованно внёс изменения в существенные условия 13 муниципальных контрактов, выразившиеся в установлении авансирования в размере от 30 до 49% от суммы контрактов.


№ п/п	Подрядчик	Наименование организации, в котором проведен капитальный ремонт	Стоимость контракта без учета дополнительных контрактов	В Т.Ч.		Дополнительное соглашение об авансировании	Размер аванса согласно доп. соглашению к контракту	% аванса
				ФБ	МБ			
1	ПК "МОНТАЖНИК"	МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №7" городского округа "город Якутск"	120 726,2	107 446,3	13 279,9	№1 от 22.03.2023	36 217,9	30,0
2	ПК "МОНТАЖНИК"	МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О. Кривошапкина" (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа "город Якутск"	75 406,5	67 111,8	8 294,7	№1 от 22.03.2023	22 622,0	30,0
3	ООО "КИНГ-95"	МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №26" (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа "город Якутск"	59 993,0	53 393,7	6 599,2	№1 от 22.03.2023	17 997,9	30,0
4	ООО "ВЕРТИКАЛЬ"	МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 13" городского округа "город Якутск"	120 726,2	107 446,3	13 279,9	№1 от 22.03.2023	59 155,9	49,0
5	ООО "КОМРИТ"	МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №12" городского округа "город Якутск"	34 900,0	31 061,0	3 839,0	№1 от 10.04.2023	10 470,0	30,0
6	ПК "МОНТАЖНИК"	МОБУ "Табагинская средняя общеобразовательная школа" городского округа "город Якутск"	69 422,4	61 785,9	7 636,5	№1 от 22.03.2023	20 826,7	30,0
7	ООО "ВЕРТИКАЛЬ"	МОБУ "Саха гимназия" городского округа "город Якутск"	117 894,3	104 925,9	12 968,4	№1 от 22.03.2023	57 768,2	49,0
8	ПК "МОНТАЖНИК"	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Хатасская средняя общеобразовательная школа имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых" городского округа "город Якутск"	65 889,5	58 641,7	7 247,9	№1 от 22.03.2023	19 766,9	30,0
9	ООО "ВЕРТИКАЛЬ"	МОБУ «Маганская средняя общеобразовательная школа» городского округа «город Якутск»»	70 011,8	62 310,5	7 701,3	№1 от 22.03.2023	34 305,8	49,0
10	ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ "УРАН"	МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №19" городского округа "город Якутск"	71 300,0	63 457,0	7 843,0	№1 от 23.03.2023	21 390,0	30,0
11	ООО "ГАЗБОЙЛЕР"	МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №24 имени С.И. Климакова" городского округа "город Якутск"	29 400,0	26 166,0	3 234,0	№1 от 21.04.2023	8 820,0	30,0
12	ООО "САНТЕХСТРОЙ 2008"	МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №38" (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа "город Якутск"	38 971,9	34 685,0	4 286,9	№1 от 10.04.2023	11 691,6	30,0
13	ООО "ОПТИМА-СТРОЙ"	МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №29" (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа "город Якутск"	122 721,2	109 221,8	13 499,3	№1 от 23.03.2023	36 600,0	29,8
<b>Итого</b>			<b>997 362,9</b>	<b>887 653,0</b>	<b>109 709,9</b>		<b>357 632,7</b>	



## Анализ достижения установленных целевых показателей (индикаторов) основных мероприятий, направленных на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений, муниципальных программ «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» и «Развитие образования городского округа «город Якутск»

Контрольным мероприятием установлено значительное занижение плановых значений показателя (индикатора) муниципальных программ в части количества муниципальных образовательных учреждений, в которых проводился капитальный ремонт.

### Плановые показатели капремонта ОУ

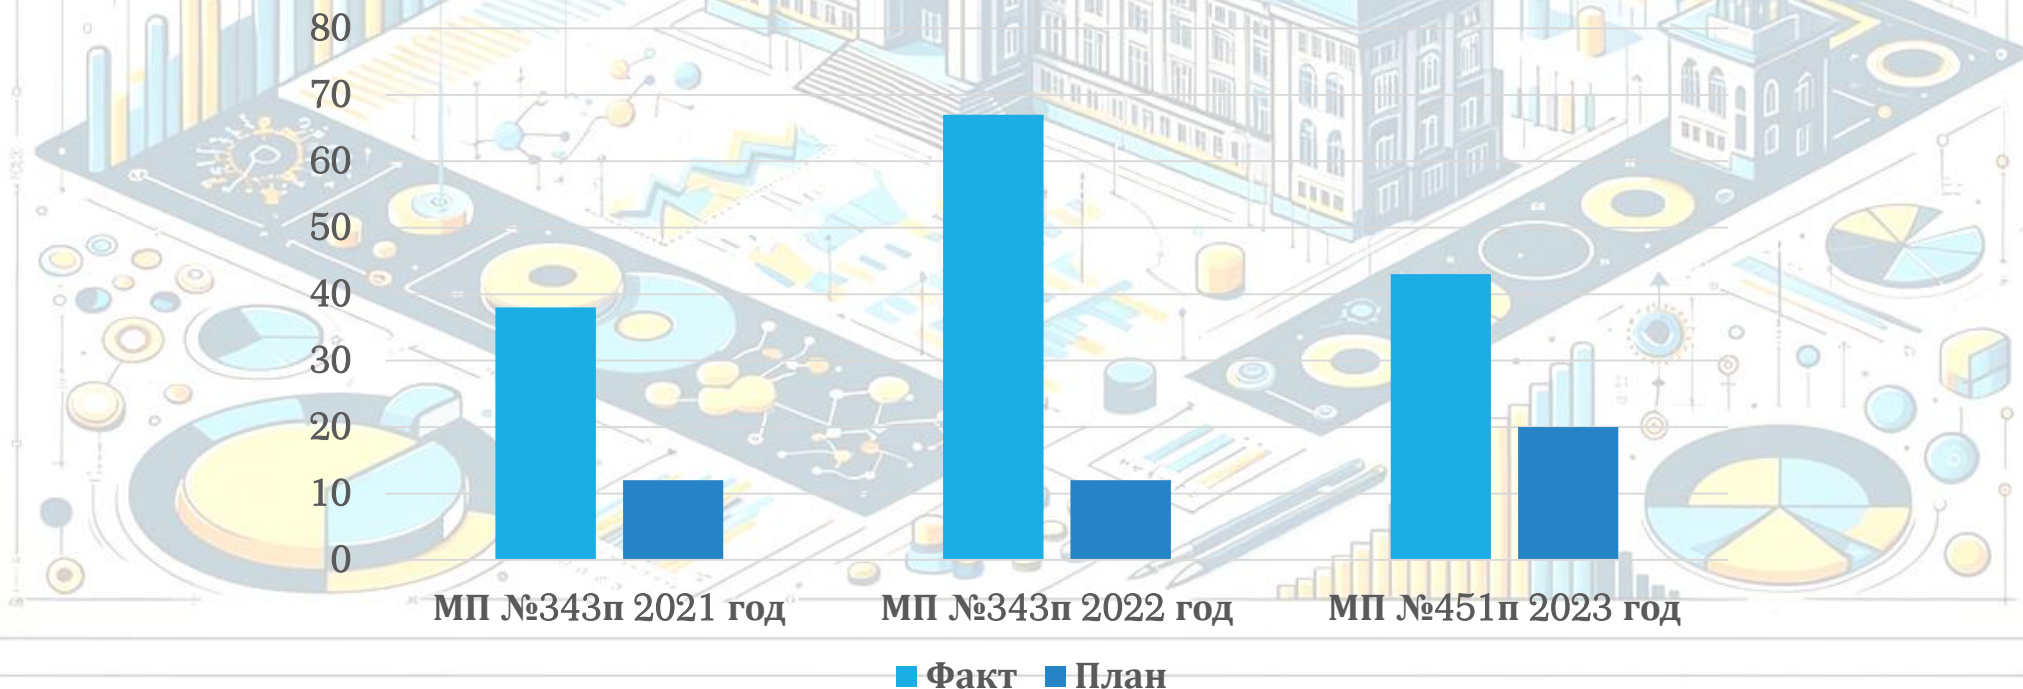



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**
