

**Отчёт по муниципальным программам за 2021 год и план 2022 год
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Окружной администрации города Якутска**

По муниципальной программе «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» уточнённый план составляет 1 101 829,91 тыс. рублей, из них с бюджета городского округа «город Якутск» - 725 291,91 тыс. рублей, с государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 376 538,00 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств с бюджета городского округа «город Якутск» составило 1 089 936,02 тыс. рублей (98,92% к уточнённому плану), из них с бюджета городского округа «город Якутск» - 502 138,50 тыс. рублей, 713 398,02 (98,36%) с государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 376 538,00 тыс. рублей (100%).

Неисполнение составило 11 893,89 тыс. руб. (1,08% к уточнённому плану).

По подпрограмме 1 «Обеспечение безопасного функционирования жилищного фонда городского округа «город Якутск» предусмотрено 19 453,29 тыс. рублей. Исполнено на сумму 19 400,35 тыс. руб. (99,73%).

По подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «город Якутск»» предусмотрено 1 273,17 тыс. руб. Исполнено на сумму 1 273,17 тыс. руб. (100% к кассовому плану).

По подпрограмме 3 «Обеспечение функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск» предусмотрено 905 530,11 тыс. руб., освоено 901 722,87 тыс. рублей (99,58 к кассовому плану), из них с бюджета городского округа «город Якутск» 525 184,87 тыс. рублей (99,28% к кассовому плану), с государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 376 538,00 тыс. рублей (100% к кассовому плану).

По подпрограмме 4 «Обеспечение исполнения услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства» всего предусмотрено в 2021 году 175 573,34 тыс. руб., из них освоено 167 539,63 тыс. рублей (95,42% к уточнённому плану).

По муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы» уточнённый план составляет 203 663,67 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 188 330,43 тыс. рублей (92,47% к уточнённому плану), в том числе за счёт республиканского бюджета 103 461,05 тыс. руб. (94,03% к кассовому плану).

По подпрограмме 1 «Развитие систем теплоснабжения» всего предусмотрено 4 951,51 тыс. руб. Исполнено – 4 951,51 тыс. руб. (100% к уточнённому плану).

По подпрограмме 2 «Развитие систем водоснабжения» уточнённый план составил 336,90 тыс. рублей, сумма исполнения составила 336,90 тыс. руб.

По подпрограмме 3 «Развитие систем водоотведения» освоено 39 019,10 тыс. рублей (100%) при уточнённом плане 39 356,56 тыс. руб. В том числе:

По подпрограмме 5 «Развитие систем наружного освещения» освоено 71 271,76 тыс. рублей (90,62%) при уточнённом плане 78 651,69 тыс. руб., в том числе за счёт республиканского бюджета 63 431,87 тыс. руб. (90,62%). Отклонение от уточнённого плана в сумме 7 379,92 тыс. руб. – экономия по выполнению.

По подпрограмме 7 «Развитие систем газоснабжения» освоено 52 784,3 тыс. рублей (93,42% к кассовому плану) при уточнённом плане 56 501,70 тыс. руб.

По подпрограмме 8 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» исполнение составило 19 966,86 тыс. руб. (83,66% к кассовому плану) при уточнённом плане 23 865,32 тыс. руб.

По муниципальной программе "Охрана окружающей среды ГО "город Якутск" на 2021-2025 годы" предусмотрено 115 585,72 тыс. руб., исполнение составило 109 758,91 тыс. рублей (99,98% к кассовому плану). Неисполнение составило в размере 21,50 тыс. руб.

По подпрограмме №2 «Обращение с отходами производства и потребления» исполнение составило 110 222,60 тыс. руб. (99,98 % к кассовому плану) при уточнённом плане 110 242,25 тыс. руб.

По подпрограмме №3 «Охрана городских лесов» исполнение составило 474,44 тыс. руб. (100,00 % к кассовому плану) при уточнённом плане 474,44 тыс. руб.

По подпрограмме №4 «Об ответственном обращении с животными» исполнение составило 328,08 тыс. руб. (99,42 % к кассовому плану) при уточнённом плане 330,00 тыс. руб.

По муниципальной программе «Развитие территориального общественного самоуправления на территории ГО «город Якутск» на 2021-2024гг.» предусмотрено 3375,0 тыс. руб., исполнение составило 3 038,85 тыс. руб. (99,67 % к уточнённому плану).

В рамках мероприятия «Благоустройство территорий территориальных общественных самоуправлений на территории городского округа «город Якутск» грант на благоустройство территорий предоставлен ТОС «Героев ВОВ» в сумме 3050,0 тыс. руб. Из них по факту выполненных работ произведён возврат в сумме 11,15 тыс. руб.

По мероприятию «Организация и проведение городского конкурса «Миллион цветов» был проведён тематический конкурс «Миллион цветов» на лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление среди предприятий,

объектам торговли и услуг, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, дворовых территорий, общественных организаций на общую сумму 325,0 тыс. рублей. Оплата была произведена всем победителям.

План на 2022 год **Откачка воды при помощи АСМ на 2022 год.**

На откачку заниженных мест с дорожного полотна улиц при помощи АСМ предусмотрено на 2022 год 4 800,00 тыс. руб. – объем воды 9635,6 м³. Откачка производится согласно распоряжения Окружной администрации г. Якутска от 02 марта 2022 года №310р.



16 апр. 2022 г. 15:48:16
32 улица Коммунаров
город Якутск
Республика Саха (Якутия)

Задачи (планы) на 2022 год и будущие годы:

- Разработка дорожной карты по обеспечению отведения (приёма) грунтовых, талых и дождевых вод на территории ГО «город Якутск»;
- Включение в план-график на 2022-2023 годы разработку схемы ливневой канализации ГО «город Якутск»;

Вывоз снега

Вывоз снега					
2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.
	342 992 м3	428 299 м3	584 781 м3	482 190 м3	500 001,5 м3

Сама проблема на начало 2022 года:


- увеличение объёмов нормы осадков на 250-300% (УГМС);
- износ специализированной техники.

Поставленная задача перед началом года:

- увеличение производства работ по вывозу снега;
- обновление специализированной техники.

Решение проблемы:

- Подрядной организацией АО «Якутдорстрой» произведены работы по вывозу снега объёмом 330 158,0 м3. с улиц общей протяженностью 282,702 км. площадью – 2 547, 245 тыс. м2. с тротуаров общей площадью - 308,729 тыс. м2 и площадей общей площадью - 54 419,7м2.

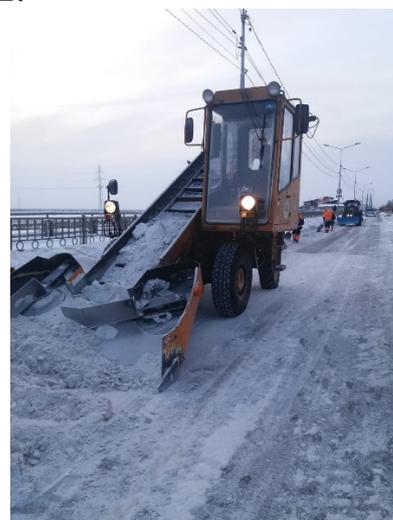

Проблемы в решении:

- факторы, негативно повлиявшие на решение – увеличение объёмов нормы осадков на 250-300%;
- с учетом круглосуточной и круглогодичной работы техники, общий процент износа техники составляет свыше 80%.

Задачи (планы) на 2022 год и будущие годы:

- Организация 2х дополнительных мест складирования снега;
- Запланированы работы по вывозке снега с улиц с общей протяженностью - 354,52 км, улиц, с площадей с общей площадью - 54 419,7м2, с тротуаров с общей площадью - 323,646 тыс.м2.

«Ямочный ремонт дорожного полотна с применением горячей асфальтобетонной смеси на территории городского округа «город Якутск»


Сама проблема на начало 2022 года:

- устаревшие и износившиеся с повреждёнными дефектами асфальтобетонные покрытия на уличной-дорожной сети на территории г. Якутска, (неровности, деформации, шелушения, трещины, сколы, выбоины, ямы)

Поставленная задача перед началом года:

- ремонт улично-дорожной сети г. Якутска по следующим адресам: ул. Хабарова, ул. Автодорожная, ул. Сергеляхское шоссе, ул. Богдана-Чижика, ул. Лермонтова, ул. Халтурина, ул. Виллойский тракт, ул. Дзержинского, ул. 50 лет Октября, ул. Севастопольская, ул. Кальвица, ул. Покровский тракт, ул. Строителей, ул. С. Данилова, ул. Кулаковского, ул. Тимирязева, ул. Быковского, ул. Гагарина, ул. Мерзлотная, пер. Энергетиков, ул. Новопортовская, ул. 50 лет Советской армии, от Покровского тракта до Гериатрического центра, ул. Пояркова, ул. Ойунского, ул. Дежнева.



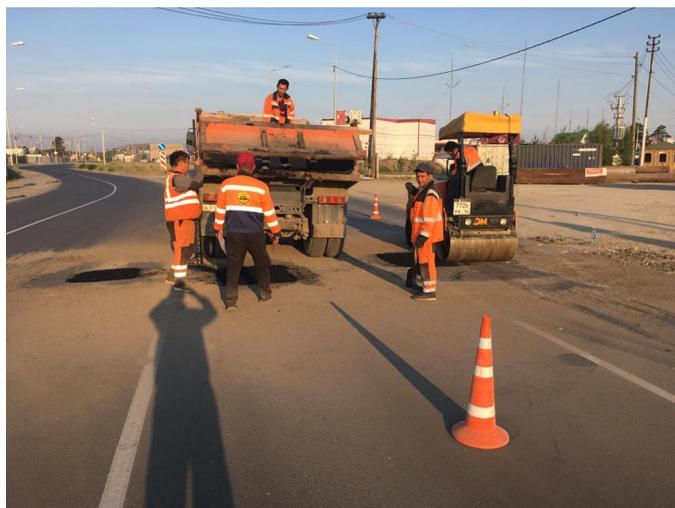

«Содержание Городского канала в г. Якутске»

Сама проблема на начало 2021 года:

- не удовлетворительное состояние проточности городского канала на территории ГО "город Якутск"

Поставленная задача перед началом года:

- улучшение состояния городского канала города путем очистки и обеспечения проточности озёр;
- соединение озёр (оз. ЯНИИТ с Большим кольцом горканала)
- содержание городского канала малого кольца (от оз. Сайсары - оз. Талое - ул. Кальвица - оз. Хомустах до оз. Колонии ВПС-4) - 11,5 км, большого кольца (от шлюза регулятора речки Шестаковка - Атласовские озера - оз. Сергелях - Чочур Мыраан - Хатын Урэх - Белое озеро - ВПС - 6 протока Лена, Марха) - 32 км

Решение проблемы:

- Подрядной организацией АО «Якутдорстрой» произведены работы по дноуглублению Горканала (от м-н Айгюль ул. Кальвица до ул. Леваневского оз. Хомустах) соединению озёр (оз. ЯНИИТ с Большим кольцом горканала) скосу камыша и уборка от случайного мусора, на общую сумму 4 672, 86 тыс. руб.



Задачи (планы) на 2022 год и будущие годы:

- запланировано 4 812,48 тыс. руб. на содержание Городского канала.
- разработка ПСД "Водообеспечение оз. Сергелях ГО г. Якутск".

«Выполнение работ по устройству тротуара из плиток»

На 2022 год предусмотрено 741, 42тыс. рублей на устройство тротуаров – объем 156,62 м2.

Сама проблема на начало 2022 года:

- отсутствие тротуара для жителей маломобильных групп населения.

Задачи (планы) на 2022

Сергеляхское шоссе, 12 км. в районе дома №13.

Наружное освещение по МП «Светлая столица»


МП СВЕТЛАЯ СТОЛИЦЫ					
2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.
	18 объектов	9 объектов	13 объектов	34 объектов	3 объекта

Сама проблема на начало 2022 года (если нет исходного состояния):

Нехватка освещения улиц на территории городского округа «город Якутск»;

Поставленная задача перед началом года:

-Реконструкция и устройство линий наружного освещения на 31 объектах на сумму 78 651,68 тыс. руб.

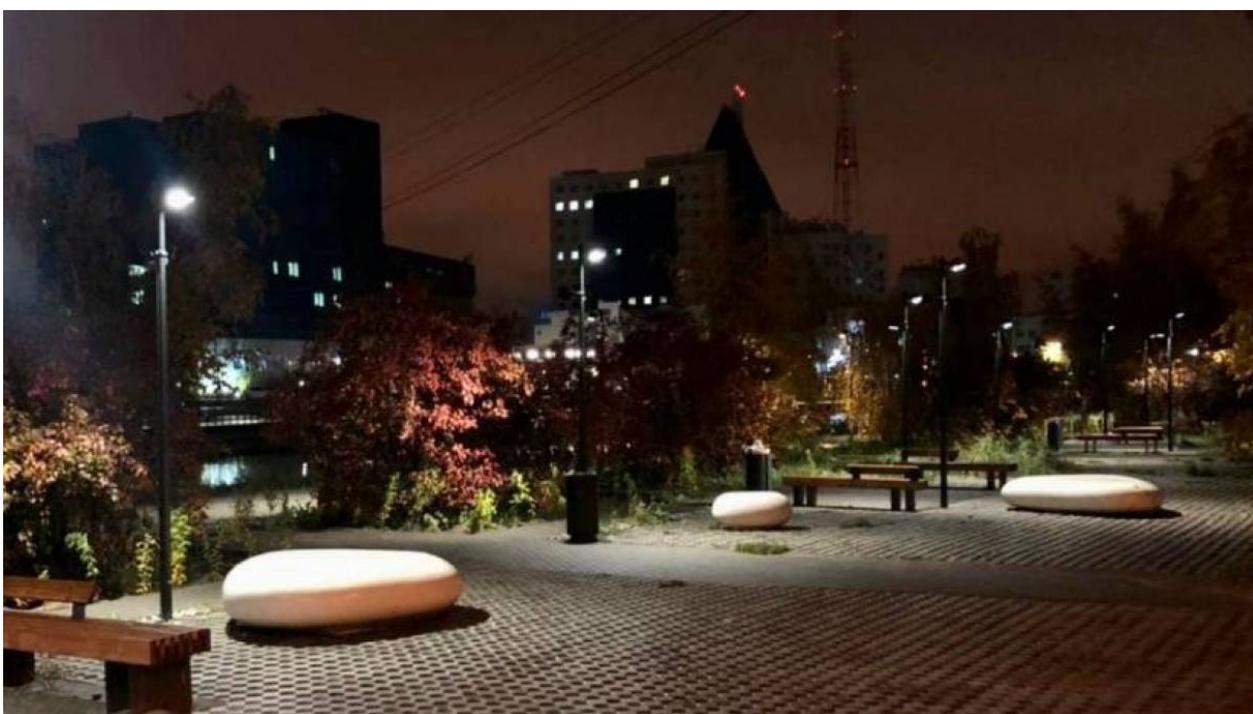

Решение проблемы:

- Произведены работы по следующим объектам:

№ пп	Наименование работ	кол-во опор, шт	кол-во светильников, шт,	кол-во СИП, м,	Кол-во ШУ, шт
	Пригород				
1	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, с.Табага, ул.Центральная	17	17	600	0
2	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск,	1	1	370	0

	с.Хатассы, ул.Молодежная				
3	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, с.Хатассы, ул.С.Алексеева	0	40	1500	0
4	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, мкр.Кангалассы, ул.Молодежная	2	7	59,5	0
5	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, мкр.Кангалассы, ул.Комсомольская	4	5	172	0
6	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, мкр.Северный (подъездная дорога)	34	0	1135	1
7	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, с.Капитоновка, ул.Подгорная	9	16	750	1
8	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, с.Тулагино от автобусной остановки до д.37 по ул.Молодежная	34	38	1240	1
9	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, с.Пригородное, ул.Шестаковский проезд	31	31	1020	0
10	Строительство линии наружного освещения по адресу: мкр.Марха, ул.Интернациональная	42	42	1480	1
11	Строительство линии наружного освещения по адресу: мкр.Марха ул. Набережная	58	58	1900	1
12	Строительство линии наружного освещения по адресу: с.Владимировка, ул. Березовая Роща	22	22	740	0
13	Строительство линии наружного освещения по	22	22	780	0

	адресу: с.Владимировка, ул. Селлях				
14	Строительство линии наружного освещения по адресу: с.Маган, ул.Брусничная	9	9	320	0
15	Реконструкция линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, мкр.Марха, территория СОШ №32	7	12	210	0
	Итого	292	320	12276,5	5
	город Якутск				
1	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Студенческая на участке от д.13Г до д.12 (Племхоз)	13	13	452	0
2	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, Старый Покровский тракт на участке от ул.Автомобильная до ул.И.Крафта	63	63	1760	0
3	Реконструкция линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, К.Алексеева, д.13/3, д.13/4, д.13/5	5	5	137	0
4	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.С.Данилова, д.4/1, д.4/2, д.6	3	3	143	0
5	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Кузьмина, д.29, д.29/1, д.29/2	2	2	62	0
6	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Лонгинова, д.38, д.38/1	3	3	98	0
7	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Займа, д.4а	0	3	111	0

8	Реконструкция линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Короленко, 19	2	9	230	0
9	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Стадухина, 63	2	3	91	0
10	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Три Сосны до ул.Билибина, д.4/2	0	4	119	0
11	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул. Автострада 50 лет Октября, д.д.6/1-6/3, 8/1-8/3, 10/1-10/2, 12/1 (ДСР)	16	16	640	0
12	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, от ул.Чайковского д.38 до ул.Гимеинская,д.32/6, ул.Чайковского, д.44/2	20	20	660	0
13	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Пушкина на участке от ул.Лермонтова до ул.Пояркова	14	14	480	0
14	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул. 8 Марта	18	18	580	0
15	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, от д.33д по Сергеляхскому шоссе 8км до д.25 по Сергеляхскому шоссе 10 км.	54	54	1700	1
16	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, на участке от д.2/2 по ул.Кульбертинова до д.13Г по ул.Студенческой (Племхоз)	67	54	1910	1
17	Реконструкция линии наружного освещения по адресу: г.Якутск,	7	7	300	0

	территория Республиканской больницы №2				
18	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Кольцевая от д.14 до д.101	45	45	1500	1
19	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, на участке от Покровского тракта до Речевой школы	33	33	1100	1
	Итого	367	369	12073	4
	ВСЕГО	659	689	24349,5	9



Задачи (планы) на 2022 год и будущие годы:

Список объектов из ранжированных реестров заявок по мероприятию «Строительство, реконструкция объектов системы наружного освещения» в г. Якутске, планируемых к реализации в 2022 г. за счёт муниципального бюджета

№ п/п	Адрес	Протяженность (п.м.)	Стоимость мероприятия
1	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Христофора Максимова на участке от пер.Курнатовского до Хатынг- Юряхского шоссе	1500	6 784 803,00
2	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Газамагистральная на участке от ул.Курнатовского до ул.Матчитова	1320	4 518 320,00

	Итого по городу	2820	11 303 123,00
3	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, с.Хатассы, улицы Багарах 1-ая и Багарах 2-ая	490	867 909,00
	Итого по пригороду	490	867 909,00
	РЕЗЕРВ		1 146 068,00
	ИТОГО	3 310	13 317 100,00

При возникновении экономии при строительстве вышеуказанных объектов, добавить следующий объект:

№ пп	Наименование работ	Протяженность (п.м.)	Стоимость мероприятия
1	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, с.Хатассы, ул.Хоринская	850	1 988 459,00

Список объектов из ранжированных реестров заявок по мероприятию «Строительство, реконструкция объектов системы наружного освещения» в г. Якутске, планируемых к реализации в 2022 г. за счёт республиканского бюджета

№ пп	Наименование работ	Протяженность (п.м.)	Стоимость мероприятия
		план	план
	ГОРОД		
1	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, квартал Наука	1600	7 261 189,00
2	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, пр. Ленина, д.60, территория МОБУ СОШ № 3	150	728 256,00
3	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Каландаришвили, д.34/1, территория МБДОУ Детский сад №21 «Кэнчээри»	360	1 770 389,00
4	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул. Ефимова	250	1 217 407,00

5	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул. Кычкина	90	188 780,00
6	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул. Птицефабрика 13	180	921 467,00
7	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Тимирязева на участке от д.72 до д.78	160	292 857,00
8	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, квартал 168, ул. 50 лет Советской Армии, 86 (общезития)	300	1 380 128,00
9	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Громовой на участке от ул.Красноярова до ул.Дежнева	140	261 328,00
10	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, Покровский тракт, пешеходные переходы	300	2 208 527,00
11	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Уустаах Избекова на участке от ул. Мерзлотной до детского сада №42 "Мамонтенок"	280	1 237 268,00
12	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул. Автомобилистов	1180	4 985 003,00
13	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, пер.Кушнаревский	800	3 617 268,00
14	Строительство линии наружного освещения по адресу: г. Якутск, Старый покровский тракт на участке от д. 6 до д. 74	1200	5 205 708,00
15	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Чкалова на участке от ул.Дежнева до ул.Гастелло	590	2 733 427,00

16	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, квартал 124, ул. Крупской (ул. Крупской, от д.8 до д.28/1, ул. Крупская от д. 10 (д. 77) до выезда на ул. Чернышевского, квартал Крупской 22, 22/1, 22/4, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 26/1)	570	2 749 522,00
	Итого	8150	36 758,52
	ПРИГОРОД		
1	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, с. Капитоновка: ул. Заречная	1510	4 465 201,00
2	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, с.Пригородный ул.Степная	1960	8 197 430,00
3	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, с.Сырдах ул. Парковая	930	1 259 525,00
4	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, с.Сырдах ул. Сосновая	400	837 226,00
5	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, мкр.Кангалассы пер. Северный	420	2 051 823,00
6	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, с.Тулагино ул. Строительная	650	1 238 403,00
7	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, с.Тулагино ул. Юбилейная	610	1 190 884,00
8	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, мкр.Марха ул. Мелиораторов	2380	9 893 587,00
9	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, с.Тулагино, ул.Дачная	810	3 304 429,00
	Итого	9670	32 438 510,00
	ВСЕГО	17820	69 197 030,00
	РЕЗЕРВ		802 970,00
	ВСЕГО ПО РЕСПУБЛИКАНСКОМУ БЮДЖЕТУ:		70 000 000,00

Озеленение



Озеленение					
2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.
755 м2	6090 м2	804 м2	805 м2	935 м2	1762 м2

Сама проблема на начало 2022 года (если нет исходного состояния):

Нехватка зеленых зон в местах массового отдыха населения и вдоль автомобильных дорог.

Поставленная задача перед началом года:

- Посадка цветов и многолетних кустарников на территориях общественных пространств – 1762 м2;
- Текущее обслуживание существующих зеленых насаждений вдоль дорог и в круговых развязках.

Проблемы в решении:

- потребность в замене большого объема грунта вдоль автомобильных дорог для посадки зеленых насаждений для обеспечения достаточной приживаемости;
- отсутствие доступа к точкам водоразбора централизованного водоснабжения, результатом чего является недостаточный и своевременный полив в достаточных объемах);
 - нехватка достаточного объема саженцев необходимых параметров и качества;

- нехватка лимитов доведенных бюджетных средств для увеличения объема посадки древесных насаждений вдоль автомобильных дорог, устройства газонов на открытых грунтах, их содержания (своевременного полива в достаточных объемах).

Задачи (планы) на 2022 год и будущие годы:

По лимитам МКУ СЭГХ

- посадка однолетних цветов в количестве 50 000 шт;
- посадка кустарников в количестве 100 шт;

Проведение текущего ремонта на скверах и площадях



Сама проблема на начало 2022 года (если нет исходного состояния):

Неудовлетворительное состояние главных площадей и скверов. Нехватка лимитов на проведение ремонтных работ. Пл. Победы, пл. Орджоникидзе, сквер Матери.

Поставленная задача перед началом года:

- Текущий ремонт пл. Победы и СМ Солдат Туймаады к празднованию 9 мая;
- Текущий ремонт сквер Матери ко Дню матери в РС(Я);
- Текущий ремонт пл. Орджоникидзе ко Дню города.

Решение проблемы:

- Включение капитального ремонта пл. Победы в МП «Формирование современной городской среды» и реализация до 80-летия Победы в ВОВ (2025г.) (пл. Орджоникидзе и сквер Матери включены в МП)
- Проведение текущего ремонта на площадях.

В 2022 году на мероприятие «Возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат, в неблагоустроенных,

частично благоустроенных, аварийных многоквартирных домах и в жилых домах блокированной застройки" предусмотрено 18 188, 44 тыс. рублей



В соответствии с постановлением Окружной администрации города Якутска от 01 марта 2017 года №58п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещению затрат, в неблагоустроенных, частично благоустроенных, аварийных многоквартирных домах и в жилых домах блокированной застройки, также по установке пожарной сигнализации в благоустроенных деревянных домах, расположенных на территории городского округа «город Якутск»» с 01 февраля по 02 марта 2022 года осуществлён приём заявок на предоставление субсидии юридическим лицам.

Поступило 6 заявок и по результатам проверок победители не выявлены.

На техническое диагностирование ВДГО в муниципальных квартирах в 2022 году предусмотрено 65,09 тыс. рублей.



На основании поступившего в адрес Окружной администрации города Якутска уведомления АО «Сахатранснефтегаз» УГРС о планах отключения газоснабжения 47 многоквартирных домов на территории городского округа «город Якутск» в связи с истечением сроков эксплуатации внутридомового газового оборудования на 2022 г., в данный момент идёт работа с управляющими компаниями по вопросу проведения технического диагностирования ВДГО в муниципальных квартирах.

На проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «город Якутск» - 3 461,08 тыс. рублей.



В настоящее время идёт работа по выявлению муниципальных жилых помещений, нуждающихся в проведении капитального ремонта.

На ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «город Якутск» и (или) общего имущества многоквартирных домов и прочих жилых зданий, смежных с муниципальными жилыми помещениями – 14 664,22 тыс. рублей.



В этом году было проведено аварийно-восстановительная работа после пожара в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Якутск, ул. Якутская, д. 4 А на сумму 498,97 тыс. рублей.

Информация по вопросу строительства канализационных очистных сооружений с. Табага

В настоящее время в селе отсутствует централизованная система канализации. Сброс сточных вод предусматривается в отдельные ведомственные канализационные сборники.

План мероприятий по строительству канализационной очистной станции с. Табага направлен на реализацию мероприятий по созданию доступных услуг утилизации сточных вод в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы».

Существующий объем хозяйственно-бытовых стоков из септиков и выгребных ям:

Потребитель	Объем, м3/сут
Жилой фонд	420,00
МОБУ ТСОШ	5,00

МБДОУ Д/с 103 "Родничок"	5,00
ОГПС РС (Я) №40 по МО ГО "город Якутск" ПЧ-11	0,70
Филиал ЯГБ №3	0,90
Табагинское отделение "Почта России"	0,30
ФКУ ИК-7 УФСИН России по РС (Я)	270,00
ДШИ	0,31
ДК Кедр	3,29
ИТОГО	705,50

Планируемое строительство:

Потребитель	Объем, м3/сут
школа на 360 мест	5,76
станция очистки питьевой воды	216
перспективное заселение 205 зем.участков для предоставления многодетным семьям	123
ИТОГО	344,76

Всего: (705,5 м3/сут + 344,76 м3/сут) + 10% резервная мощность = 1155,26 м3/сут

Проектная мощность КОС - 1200 м3/сут.

Выполнены инженерно-гидрометеорологические изыскания на КОС Табага, согласно рекомендациям отчета, при проектировании слива очищенных канализационных вод необходимо предусмотреть строительство дамб ограничивающих растекание потока.

На разработку ПИР и ПСД гидротехнического сооружения (ГТС) р. Мыттах на 2022 год, НМЦК на сумму 3 865 137,31 руб. Разработано техническое задание, в апреле 2022 планируется публикация электронного аукциона.

03.12.2021 заключено соглашение с АО «Водоканал» о предоставлении из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с проектированием объекта капитального строительства: «Канализационная очистная станция (КОС) в с. Табага городского округа «город Якутск» на сумму:

- в 2021 году – 2 060,00 тыс. руб.

- в 2022 году – 6 960,00 тыс. руб.

Возмещены мероприятия по разработке технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям, технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий, научно-технического отчета по результатам оценки археологической перспективности территории земельного отвода.

Информация по вопросу реконструкции канализационных очистных сооружений мкр. Кангалассы

В настоящее время необходимо строительство новой канализационной очистной станции на территории микрорайона Кангалассы. Технология очистки существующей станции устарела, требуется спроектировать новую. Анализы стоков на выходе из станции превышают нормативные показатели.

План мероприятий по строительству канализационной очистной станции в мкрн. Кангалассы направлен на реализацию мероприятий по созданию доступных услуг утилизации сточных вод в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы».

Планируется обеспечить водоотведение следующих объемов канализационных стоков:

Потребитель	Объем, м3/сут
<i>Существующий объем:</i>	
Существующий жил.фонд	464,7
Тулагино-Кильдямцы (вывозная)	60
<i>Перспективное подключение:</i>	
Школа-сад на 220/110 мест	12,03
Территория опережающего развития	263,3
ВСЕГО:	800
<i>Перспективное строительство:</i>	
Суперкампус	Будет определен проектом

Проектная мощность КОС: 800 м3/сут + объем Суперкампуса
(будет определен проектом).

Также проектом будет предусмотрен реконструкция существующих внутриквартальных сетей водоотведения в мкрн. Кангалассы.

07 апреля 2022 года (до 07 мая 2022 года) объявлено о проведении отбора получателя субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением изыскательских работ и разработке ПСД на реконструкцию КОС в мкрн. Кангалассы.

Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете ГО «город Якутск» на реализацию мероприятия:

- в 2022 году – 6 650,00 тыс. рублей.
- в 2023 году – 2 850,00. тыс. рублей.


В техническом задании проекта будет включено мероприятия по капитальному ремонту существующих сетей водоотведения в микрорайоне.

Информация по мероприятиям водоснабжения села Маган



МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства»
ГО «город Якутск»

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ



В 2021 ГОДУ:

- **С. МАГАН, С. ТАБАГА:** РАЗРАБОТАНО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
- **С. ТАБАГА:** ПРОВЕДЕНЫ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТНОЙ СТАНЦИИ

В 2022 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ:

- **МКР. МАРХА, БЕЛОЕ ОЗЕРО:** РАЗРАБОТКА ПИР, ПСД ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО КРУГЛОГОДИЧНОГО ХОЛОДНОГО СНАБЖЕНИЯ
- **С. ТАБАГА:** РАЗРАБОТКА ПИР, ПСД КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТНОЙ СТАНЦИИ
- **Г. ЯКУТСК:** УСТАНОВКА МОДУЛЬНЫХ СЛИВНЫХ СТАНЦИЙ

Водоснабжение в селе Маган осуществляется частично с использованием централизованных систем холодного водоснабжения и путем подвоза воды. Источником холодного водоснабжения служат подземные воды скважин № МГП-3 и № Я-36 филиала «Коммунакомплектация» ГУП «ЖКХ РС (Я)»:

№	Наименование источника	Установленная производительность м3/сут	Установленный лимит, м3/сут	Необходимая фактическая производительность
1	Скважина №МГП-3	200,0	460,0	104,8
2	Скважина №Я-36	260,0		

1. Согласно выводам технического отчета по с. Маган на технико-экономическое обоснование необходимо предусмотреть следующие капитальные вложения для реализации вариантов проекта водоснабжения

№ п/п	Наименование варианта	Стоимость проектных работ, руб	СМР, руб	Всего:
1	Строительство водоочистной станции+ строительство водозаборных скважин		36 000 000,00 (геологоразведочные работы)	65 738 100,00
		1 757 010,00	27 981 090,00 (строительство водоочистной станции)	
2	Строительство магистральных централизованных сетей водоснабжения (13,27 км)	20 571 040,00	305 825 500,00 (строительно-монтажные работы)	326 396 540,00

Первый вариант реализации проекта включает в себя I этап мероприятия по строительству водоочистной станции со строительством водозаборных скважин и включают в себя установку двух блочно-модульных станций водоподготовки, установку двух резервуаров для чистой воды, монтаж двух насосных станций II подъема для скважин МГП-3 и Я-36. После реализации этапа планируется II этап, включающий в себя строительство магистральных сетей от водоочистной станции до потребителя.

Итоговая сумма строительства водоочистных станций с геологоразведочными работами и **без учета** строительства скважины составляет **65 738,10 тыс. руб.**

Второй вариант реализации проекта представляет собой строительство магистральных централизованных сетей водоснабжения, возможная точка подключения к магистральным сетям водоснабжения г. Якутска системы водоснабжения с. Маган является проектируемый водопровод мкр. Марха (перекресток Маганского тракта и ул. Экспериментальная), примерная протяженность трассы водоснабжения до с. Маган составляет 13,266 км, диаметр необходимо определить проектом. Также по трассе необходимо предусмотреть тепловое сопровождение водопровода и строительство повысительных насосных станций.

Ориентировочная стоимость строительства сети водоснабжения диаметром 200м с тепловым сопровождением и строительством двух повысительных насосов от мкр. Марха до с. Маган без учета строительства магистральных сетей внутри села составляет **305 825,50 тыс. руб.**

Обращаем внимание что, определить способ прокладки без оценки и инженерно-мерзлотных свойств и особенностей грунтов, без проведения инже

нерно-геологических изысканий не представляется возможным. Стоимость работ является ориентировочной, основные характеристики магистральных сетей должны определяться непосредственно проектом.

Информация по мероприятиям водоснабжения села Табага

1. На территории с. Табага в настоящее время работают три водозаборные скважины №3017, №Я-35 (ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Саха (Якутия)) и N 6-20 (АО «Теплоэнергия»). Скважина ФКУ ИК-7 работает с постоянными перебоями и качество воды не соответствует требованиям.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения с. Табага:

№ п/п	Наименование источника	Установленная производительность, м3/сут	Установленный лимит м3/сут.	Фактическая производительность, м3/сут	Требуемое количество м3/сут
1	Я-35	960,0	840,0	249,6	808,1 (хоз.быт)
2	№3017	960,0			
3	№6-20	768,0	470,0	140,3	
	Сумма	2688,0	1310,0	389,9	808,1

Расчетные планируемые расходы воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Табага с перспективой составят 808,1 м3/сут.

№ п/п	Наименование потребителя	Число потребителей, чел.	Норма водопотребления, л/сут	Общий расход, м3/сут
1	Население	3325	120	399,0
2	Население 205 земельных участков, предоставленных многодетным семьям (перспектива)	1025	120	123,0
3	МОБУ «Табагинская средняя общеобразовательная школа» городского округа «город Якутск»	310	40	12,4
4	МБУ ДО «Табагинская детская школа искусств»	90	40	3,6
5	МБДОУ "Табагинский детский сад общеразвивающего вида "Кэскил"" МР "Мегино-Кангаласский улус"	50	40	2,0
6	Дом культуры «Кедр»	200	8	1,6
7	Поликлиника	150	10	1,5
8	Стационар	25	10	0,3

9	ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Саха (Якутия)	394	120	47,3
10	Полив	4350	50	217,5
11	Расход на пожаротушение	1 пожар	5 л/с	54,0
12	Итого:			862,1
13	Расходы воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения			808,1

№ п/п	Наименование варианта	Стоимость проектных работ, руб	СМР, руб	Всего:
1	Строительство водоочистной станции на 3 скважины	2 849 070,00	124 950 000,00	127 799 070,00
2	Строительство магистральных централизованных сетей водоснабжения (21,951 км)	32 397 930,00	504 352 990,00	536 750 920,00

Реализация первого варианта включает в себя установку трех водоочистных станций со следующими этапами очистки:

1. Фильтр грубой очистки;
2. Автоматическая установки умягчения;
3. Установка обратного осмоса;
4. Установка минерализации.

При расчете не учитывалось строительство сетей ХВС исходной воды от границы раздела с ИК-7 до места размещения станция водоподготовки с емкостями чистой воды от станции водоподготовки до существующих сетей ХВС с. Табага.

Следует отметить, что при реализации проекта, установка обратного осмоса в составе станции очистки воды будет иметь стоки в размере 9 м³/ч, т.е. **216 м³/сут.** что потребует на участке размещения **обязательного наличия канализации.**

Согласно перспективному водному балансу питьевой и горячей воды с. Табага, лимиту скважин №Я-35, №3017, а также их срока оцененных запасов, можно сделать вывод, что существующих скважин будет достаточно для покрытия перспективных расходов воды.

Второй вариант проекта предусматривает строительство магистральных централизованных сетей водоснабжения, возможная точка подключения к магистральным сетям водоснабжения г. Якутска системы водоснабжения с. Табага является водолиния «КП Гимеин-ТП Воинская часть» Ду300м, примерная протяженность трассы водоснабжения до с. Табага составляет 21,951 км, для

расчета выбран диаметр Ду200 мм. Также предусмотрено тепловое сопровождение водопровода и строительство повысительной насосной станции

Обращаем внимание что, определить способ прокладки без оценки инженерно-мерзлотных свойств и особенностей грунтов, без проведения инженерно-геологических изысканий не представляется возможным. Стоимость работ является ориентировочной, основные характеристики магистральных сетей должны определяться непосредственно проектом.

Развитие систем газоснабжения 2022



МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства»
ГО «город Якутск»

ГАЗИФИКАЦИЯ



В 2021 ГОДУ:

- **С. ТАБАГА:** ОСУЩЕСТВЛЕНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ **10** ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
- **МКР. СЕВЕРНЫЙ:** ЗАПУЩЕНО ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ **1310** ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
- **С. ХЯТАССЫ:** ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ УГРС АО "САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ"

В РАМКАХ **СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ** УТВЕРЖДЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ **1367** ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ **ДОГАЗИФИКАЦИИ**

В **2022** ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ:
РАЗРАБОТКА **ТРЕТЬЕГО ЭТАПА СХЕМЫ**
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ЯКУТСКА

РАЗРАБОТАНА **СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ**
НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ГОРОДА
ЯКУТСКА (1 И 2 ЭТАПЫ)

1) Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по газоснабжению:

- Разработана ПСД на газификацию земельных участков, предоставленных семьям, имеющих трех и более детей в мкр. Птицефабрика подрядчиком ООО "Ростройпроект" на сумму 2 443,00 тыс. рублей, заключён договор с ГАУ "Управление Госэкспертизы РС(Я)" на прохождение госэкспертизы на сумму 666 221,24 руб.

2) Мероприятие по созданию условий для подключения потребителей к системе газоснабжения:

- Разработан 3-й этап Схемы газоснабжения низкого и среднего давления городского округа "город Якутск" подрядной организацией ООО "Джи Динамика" на сумму 2 015,00 тыс. руб.

- Актуализация Схемы газоснабжения города Якутска - доведено 272 670 руб.

- Проведение гидравлических испытаний газопровода по адресу: ул. Якутск, с. Хатассы, к жилым домам на земельных участках, выделенным многодетным семьям - доведено 85,85 тыс. руб.

Подпрограмма 8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



Мероприятие № 1.2. «Капитальный ремонт бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства».

Наименование объекта	Вид работ	Заключение ДЭ /ДИиЗО	Сумма по ЛСР	АУКЦИОН	Примечание
г. Якутск, ул. Космонавтов, д. 17, 17/1	Замена участка трубопровода канализации Ду 159мм L-90п.м, Ду 219мм L-55 п.м	сз30/ДЭиСП от 14.01.2022 сз850/ДИиЗО Расп. 1070р от 02.06.2021 г.	1 760 997,60	№1-ПТО 1 255 975,00 ООО "Спецстроймонтаж плюс»	На стадии получения ордера на земельные работы
г. Якутск, мкр. Марха, ул. Якова Петерса, д. 4	Замена участка трубопровода канализации Ду 108мм. на 159мм. протяженностью 84п.м.	Получено сз81571 от 06.12.2021 сз850/ДИиЗО Расп. 1070р от 02.06.2021 г.	598 845,38	№3-ПТО 428174,44 ИП Егоров	На стадии передачи исполнительной документации
г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 7/6А	Замена участка трубопровода канализации Ду 159мм. протяженностью 57 п.м., с заменой канализационных колодцев в количестве 3 ед.	Получено сз81571 от 06.12.2021 сз850/ДИиЗО Расп. 1070р от 02.06.2021 г.	1 446 218,27	№2-ПТО 1 019 583,09 ИП Иброхимов	На стадии прокладки трубопровода
г. Якутск, ул. Пионерская, 42	Замена участка трубопровода канализации Ду 108 мм от дома 42 до КК1. L-5п.м. Ду 159 мм от КК1 до сущ КК 55 п.м.	сз209/ДЭиСП от 09.02.2022/сз850/ДИиЗО Расп. 1070р от 02.06.2021 г.	666 110,04		На открытом аукционе до 15.04.2022 года
г. Якутск, ул. Космонавтов, 21-23	Замена участка трубопровода канализации Ду 159 мм		962136,17		Направлена конкурсная документация в УМЗ
г. Якутск, ул. Рыдзинского 24к2	Перекладка трубопровода канализации подземно.		372 783,06		Ждем экономии
г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 36	Замена выпуска канализации				Необходимо признать бесхозными сетями водоотведения на выполнение ремонтных работ
г. Якутск, ул. Германа Титова, д. 2	Замена выпуска канализации				Необходимо признать бесхозными сетями водоотведения на выполнение ремонтных работ

Места (площадки) накопления ТКО и КГО



на 2022 год на обустройство 90 мест (площадок) накопления ТКО и КГО в бюджете города предусмотрены 17 303 900 руб.

Бункера для накопления ТКО (8 м3)



на 2022 год на изготовление и установку 30 бункеров для накопления ТКО выделены 5 489 950 руб.

Контейнеры для накопления ТКО (0,75 м3)



на 2022 год на изготовление и поставку 75 мусорных контейнеров выделены 1 400 000 руб.

Пункты раздельного сбора ТКО



Информация по внедрению раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории городского округа «город Якутск»



В 2021 г. изготовлены и установлены

6 шт. пунктов раздельного сбора ТКО

на общую сумму

261 208 руб.

Согласно письму ООО «Якутская экологическая компания» от 05 августа 2021 года, предприятия готова обслуживать не более 100 урн раздельного сбора мусора.

Всего в городском округе функционирует 51 точка раздельного сбора ТКО. Все пункты сбора обслуживает ООО «Якутская экологическая компания». После сбора вторсырье накапливается на базе компании, где проходит сортировку, опрессовку и заготовку для последующего вывоза на переработку в другие регионы. В пункты сбора вторсырья можно сдать три вида мусора: пластиковые бутылки, картон, алюминиевые банки.

В будущем планируется продолжить работу по данному направлению.
